SIENKIEWICZ
PRODUCENT PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

SIENKIEWICZ MAT-BUD SP. Z O.O.
tel: +48 22 612 96 02
e-mail: zapytania@sienkiewicz.com.pl
www.sienkiewicz.com.pl

FORMULARZ TECHNICZNY DOTYCZĄCY KOMÓR

1. Przeznaczenie komory


- ☐ komora wodomierzowa (niewypełniona cieczą)
- ☐ komora na urządzenie (niewypełniona cieczą)
- ☐ zbiornik na wodę (wypełniony cieczą)
- ☐ zbiornik na ścieki (wypelniony cieczą)
- ☐ inne: _____ ; wypełniony cieczą / niewypełniony cieczą
  (jakie?) (właściwe podkreślić)

Uwaga! Zbiorniki na ciecz produkowane są w klasie szczelności 1 wg PN-EN 1992-3

2. Wymiary wewnętrzne komory (skok wym. co 5cm)

dł. L [m]: _____ x szer. B [m]: _____ x wys. H [m]: _____

3. Głębokość posadowienia komory Z [m] (odległość od poziomu terenu do dna komory)

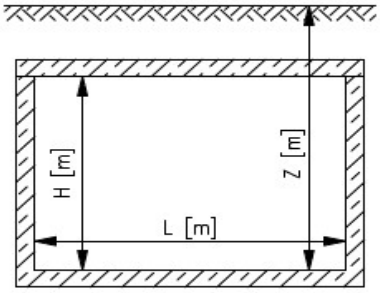

Z= _____ [m]

4. Warunki gruntowo-wodne

Czy warunki gruntowo-wodne są znane?

- ☐ **NIE** - komorę należy posadowić na podłożu nośnym o nośności min. 120 kPa
- ☐ **TAK** - należy dołączyć dokumentację geologiczną

5. Obciążenia eksploatacyjne naziomu

- ☐ tereny zielone 5 kN/m^2
- ☐ ruch ciężki: dopuszczony ruch pojazdów o max. nacisku 115 kN/oś (DMC 40t)
- ☐ inne: _____
  (jakie?)

6. Dodatkowe obciążenia działające na konstrukcję komory

☐ **NIE** ☐ **TAK** _____
(jakie?)

7. Szkody górnicze - czy występują

☐ **NIE** ☐ **TAK** _____
(jakie?)

8. Przejścia szczelne / otworowanie

Czy komora ma posiadać otwory?

☐ **NIE** ☐ **TAK** _____
(jakie?)

Czy w komorze mają zostać wklejone przejścia szczelne?

☐ **NIE** ☐ **TAK** _____
(jakie?)

9. Dodatkowe uwagi

_____

10. Załączniki (rysunek oryginalny, szkic komory, itp.)

_____

Data: _____ Podpis: _____
